



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: dokidsyda@ukr.net Код ЄАДРПОУ 37395418

24.01.2017 № 107-34/548.

на № _____ від _____

Співголови ГО КМО «Батьки SOS»
Парфьоновій О. І.
e-mail: foi+request-16310-
c2a82ac1@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді на
інформаційний запит

Шановна Олена Ігорівна!

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 06.01.2017 (наш вхід. № 107-2 (з) від 06.01.2017), розглянуто Ваш інформаційний запит та повідомляємо наступне.

У 2015-2016 роках видатків на ремонтно-будівельні роботи в дошкільному навчальному закладі № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44 передбачено не було.

У 2014 році в дошкільному навчальному закладі № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44 було проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, каналізації на суму 8155,00 грн.

Додаток: на 24 арк. в 1 прим.

Заступник голови

Н. Гусєва

033852

м. Київ

Договір № 253/14

10/04

"19" 12 2014 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації особі в.о.начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «С.М.І.» в особі директора Снітко Григорія Григоровича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
у Святошинському районі м. Києва
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2014 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.

1.2. Найменування робіт: **Капітальний ремонт внутрішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, каналізації в ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44.**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 5 років.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає Державним будівельним нормам.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить: **8 155,00 (вісім тисяч сто п'ятдесят п'ять грн.) 00 коп. в тому числі ПДВ: 1 359,17 грн.**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Зобов'язання за договором виникають лише у разі наявності відповідних бюджетних призначень.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Кінцеві розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акта виконаних робіт.

4.2. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести оплату за виконані роботи протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на рахунок.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: **грудень 2014 р.**

5.2. Місце виконання робіт: **ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44.**

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2014 р.

8.2. Дія Договору припиняється:



- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «С.М.І.» 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська буд. 8 літера «А», офіс 8 Р/р 26001013014919 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Київ Код банку 320627 ІПН 229133126535 Код ЄДРПОУ 22913310 Св. №200119728 Тел.: (044)430-93-40, (044)578-29-40 Платник податку на прибуток на загальних підставах Директор</p>  <p>Г. Г. Снітко</p>	<p>Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № 35421101077862</p> <p>в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536</p>  <p>В.о. начальника</p> <p>І.І. Коваленко</p>





Додаток № 1
до договору № 253/14
від « 19 » 12 2014 р.

**Календарний план
на виконання капітального ремонту внутрішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації в ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44.**

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	Грудень 2014 р.	Капітальний ремонт внутрішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, каналізації

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № 253/14 від « 19 » 12 2014 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «С.М.І.» 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська буд. 8 літера «А», офіс 8 Р/р 26001013014919 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Київ Код банку 320627 ІПН 229133126535 Код ЄДРПОУ 22913310 Св. №200119728 Тел.: (044)430-93-40, (044)578-29-40 Платник податку на прибуток на загальних підставах	Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № 35421101077862 в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536
Директор  Г. Г. Снітко	В.о. начальника  І.І. Коваленко



Підсумкова відомість ресурсів



№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
<u>I. Витрати труда</u>										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	99,6	19,36					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4						
3		робітниками-будівельниками								
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	3,72	20,05					
4		керуванням та обслуговуванням машин								
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7						
5		керуванням та обслуговуванням машин								
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиборничих витрат	люд-год	4,4	32,45					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	107,72						
		Середній розряд робіт	розряд	3,4						
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>										
6	+CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,0069	-					
7	+CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,39456	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,03312	<u>83,08</u> 2,75				
9	+СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,0192	-				
10	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,03312	<u>132,66</u> 4,39				
11	+СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,00306	-				
12	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	1,19232	<u>8,32</u> 9,92				
13	СН225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	3,4368	<u>43,14</u> 148,26				
14	+*С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,009	<u>73,78</u> 0,66				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		165,98				
		Дизельне паливо	кг	0,189					
		Електроенергія	кВт-год	7,985					
		Мастильні матеріали	кг	0,061					
		Гідролічна рідина	кг	0,004					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,57164					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
16	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000092	<u>18499,78</u> 1,7	<u>16382,31</u> 1,51	<u>1754,73</u> 0,16	<u>362,74</u> 0,03	30 км.
17	С111-311	Каболка	т	0,000006	<u>22045,64</u> 0,13	<u>21518,52</u> 0,13	<u>94,85</u> -	<u>432,27</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-313	Карбід кальцію для шматків 2/25	т	0,0000756	<u>4217,64</u> 0,32	<u>4035,35</u> 0,31	<u>99,59</u> 0,01	<u>82,7</u> -	30 км.
19	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,17	<u>2,42</u> 0,41	<u>1,19</u> 0,2	<u>1,18</u> 0,2	<u>0,05</u> 0,01	30 км.
20	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00014688	<u>21997,86</u> 3,23	<u>21461,25</u> 3,15	<u>105,28</u> 0,02	<u>431,33</u> 0,06	30 км.
21	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000068	<u>8660,04</u> 0,59	<u>8384,96</u> 0,57	<u>105,28</u> 0,01	<u>169,8</u> 0,01	30 км.
22	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002592	<u>8660,04</u> 0,22	<u>8384,96</u> 0,22	<u>105,28</u> -	<u>169,8</u> -	30 км.
23	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00033	<u>3523,99</u> 1,16	<u>3322,67</u> 1,1	<u>132,22</u> 0,04	<u>69,1</u> 0,02	30 км.
24	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00009612	<u>23992,12</u> 2,31	<u>23412,61</u> 2,25	<u>109,08</u> 0,01	<u>470,43</u> 0,05	30 км.
25	+C111-1608	Дрантя	кг	0,00324	-	-	-	-	
26	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,084	<u>46,48</u> 3,9	<u>45,46</u> 3,82	<u>0,11</u> 0,01	<u>0,91</u> 0,07	30 км.
27	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,034	<u>15,7</u> 0,53	<u>15,28</u> 0,52	<u>0,11</u> -	<u>0,31</u> 0,01	30 км.
28	+C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3,03	<u>70,7</u> 214,22	<u>70</u> 212,1	<u>0,17</u> 0,52	<u>0,53</u> 1,6	30 км.
29	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,00155	<u>14660,42</u> 22,72	<u>14293,43</u> 22,15	<u>79,53</u> 0,12	<u>287,46</u> 0,45	30 км.
30	&C1532-28-1	Відводи, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	<u>30,62</u> 61,24	<u>30</u> 60	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,6</u> 1,2	30 км.
31	&C1532-28-2	Відвод з різьб 1/2" гнугий	шт	4	<u>8,18</u> 32,72	<u>8</u> 32	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,16</u> 0,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00021	<u>8157,05</u> 1,71	<u>7914,74</u> 1,66	<u>82,37</u> 0,02	<u>159,94</u> 0,03	30 км.
33	C1546-54	Пароніт	т	0,0305	<u>31673,49</u> 966,04	<u>30948,1</u> 943,92	<u>104,34</u> 3,18	<u>621,05</u> 18,94	30 км.
34	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,000074	<u>35992,8</u> 2,66	<u>35182,72</u> 2,6	<u>104,34</u> 0,01	<u>705,74</u> 0,05	30 км.
35	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,2	<u>9,85</u> 11,82	<u>9,58</u> 11,5	<u>0,08</u> 0,1	<u>0,19</u> 0,22	30 км.
36	+C1630-129 варіант 1	Згони в комплекті, діаметр до 32 мм	шт	2	<u>71,5</u> 143	<u>70</u> 140	<u>0,1</u> 0,2	<u>1,4</u> 2,8	30 км.
37	&C1630-129-1	Резьба 1/2"	шт	4	<u>7,24</u> 28,96	<u>7</u> 28	<u>0,1</u> 0,4	<u>0,14</u> 0,56	30 км.
38	&C1630-129-2	Вентиль 3-ходовий 1/2"	шт	1	<u>77,62</u> 77,62	<u>76</u> 76	<u>0,1</u> 0,1	<u>1,52</u> 1,52	30 км.
39	+C1630-147 варіант 1	Вентилі	шт	4	<u>154,31</u> 617,24	<u>150,61</u> 602,44	<u>0,67</u> 2,68	<u>3,03</u> 12,12	30 км.
40	+C1630-226 варіант 1	Вентиль, діаметр 25 мм В/В	шт	2	<u>122,52</u> 245,04	<u>120</u> 240	<u>0,12</u> 0,24	<u>2,4</u> 4,8	30 км.
41	+C1630-227 варіант 1	Вентиль, діаметр 32 мм В/В	шт	1	<u>122,58</u> 122,58	<u>120</u> 120	<u>0,18</u> 0,18	<u>2,4</u> 2,4	30 км.
42	C1630-987	Термометри кутові в оправі	шт	3	<u>78,24</u> 234,72	<u>76,59</u> 229,77	<u>0,12</u> 0,36	<u>1,53</u> 4,59	30 км.
43	C1630-1160 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	<u>127,93</u> 255,86	<u>125,17</u> 250,34	<u>0,25</u> 0,5	<u>2,51</u> 5,02	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		3052,65	2986,26	9,19	57,2	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,985					
		Мастильні матеріали	кг	0,061					
		Гідролічна рідина	кг	0,004					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,222					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2014 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад  Г.І. Снітко

Перевірив



Замовник Управління освіти Святоштанської районної в м. Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник ТОВ «С.М.І.»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

На Капітальний ремонт внутрішніх мереж: ЦО, ГВП, ХВП, каналізації в ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44
Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 30 вересня 2014 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	5,14689	5,14689	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1,92826	1,92826	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3,05265	3,05265	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,16598	0,16598	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1,22464	1,22464	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	6,37153	6,37153	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,29192	0,29192	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,13238	-	0,13238
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	- 6,79583	- 6,66345	- 0,13238
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 6,79583	- 6,66345	- 0,13238
12		Податок на додану вартість (20 %) Всього договірна ціна	1,35917 8,15500	-	1,35917
		в т.ч. зворотні суми:			
		-від розбирання тимчасових будівель і споруд крім ПДВ	-		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	-		
		-від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ	-		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Г.Г. Снітко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святосвітської районної в м. Києві

державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 19 " 12 2014 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт внутрішніх мереж: ЦО, ГВП, ХВП, каналізації в ДНЗ № 214 за адресою:
вул. Котельникова, 44

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Сантехнічні роботи			
1	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100к-т	0,04	
2	Вентиль, діаметр 25 мм В/В	шт	2	
3	Вентиль, діаметр 32 мм В/В	шт	1	
4	Вентиль 3-ходовий 1/2"	шт	1	
5	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 32 мм	шт	2	
6	Згони в комплекті, діаметр до 32 мм	шт	2	
7	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	10шт	0,4	
8	Резьба 1/2"	шт	4	
9	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	100м	0,015	
10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,5	
11	Відводи, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	
12	Перепакуння	шт	20	
13	Демонтаж груп обліку	шт	2	
14	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	10шт	0,4	
15	Відвод з різьб 1/2" гнутаий	шт	4	
16	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання та опалення діаметром 32 мм	1 шт	4	
17	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,2	--
18	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих труб	100м2	0,0108	
19	Демонтаж манометрів	100шт	0,02	
20	Установлення манометрів	к-т	2	
21	Манометри загального призначення	комплект	2	
22	Заміна паронітових прокладок діаметром до 50 мм	шт	5	
23	Заміна набивки сальників пробкових кранів діаметром до 30 мм	100шт	0,03	
24	Демонтаж термометрів	100шт	0,03	
25	Установлення термометрів в оправі	к-т	3	
26	Термометри кутові в оправі	шт	3	
27	Навантаження сміття вручну	1 т	0,009	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	0,009	

Склад

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8,155 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"19" 12 2014 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт внутрішніх мереж: ЦО, ГВП, ХВП, каналізації в ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44

Складений в поточних цінах станом на 30 вересня 2014 р.



№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт теплопункта	6,372	-	-	6,372
		Разом по главі 2:	6,372	-	-	6,372
		Разом по главах 1-7:	6,372	-	-	6,372
		Разом по главах 1-8:	6,372	-	-	6,372
		Разом по главах 1-9:	6,372	-	-	6,372
		Разом по главах 1-12:	6,372	-	-	6,372
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	0,292	-	-	0,292
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,132	0,132
		Разом	6,664	-	0,132	6,796

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість (20 %)	-	-	1,359	1,359
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6,664	-	1,491	8,155

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Г.Г. Снітко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт внутрішніх мереж: ЦО, ГВП, ХВП, каналізації в ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,10772 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,103 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

2,146 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

3400,00 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

3400,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

8,155 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

6,664 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

0,132 тис.грн.


податок на додану вартість -

1,359 тис.грн.



Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:


Г. Снітко

Перевірив:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи									
1	P15-40-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100к-т	0,04	<u>17791,35</u> 2304,70	-	711,65	92,19	-	<u>110,484</u>	<u>4,42</u>
2	C1630-226 варіант 1	Вентиль, діаметр 25 мм В/В	шт	2	<u>122,52</u>	-	245,04	-	-	-	-
3	C1630-227 варіант 1	Вентиль, діаметр 32 мм В/В	шт	1	<u>122,58</u>	-	122,58	-	-	-	-
4	& C1630- 129-2	Вентиль 3-ходовий 1/2"	шт	1	<u>77,62</u>	-	77,62	-	-	-	-
5	P15-113-2	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 32 мм	шт	2	<u>22,57</u> 21,49	-	45,14	42,98	-	<u>1,092</u>	<u>2,18</u>
6	C1630-129 варіант 1	Згони в комплекті, діаметр до 32 мм	шт	2	<u>71,50</u>	-	143	-	-	-	-
7	P16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	10шт	0,4	<u>365,05</u> 179,72	<u>185,33</u> 89,83	146,02	71,89	<u>74,13</u> 35,93	<u>9,132</u> 4,5108	<u>3,65</u> 1,8
8	& C1630- 129-1	Резьба 1/2"	шт	4	<u>7,24</u>	-	28,96	-	-	-	-
9	P15-42-1	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	100м	0,015	<u>12294,03</u> 5026,67	-	184,41	75,4	-	<u>255,42</u>	<u>3,83</u>
10	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,5	<u>70,70</u>	-	106,05	-	-	-	-
11	& C1532-28- 1	Відводи, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	<u>30,62</u>	-	61,24	-	-	-	-
12	P15-76-1 Стос.	Перепакування	шт	20	<u>92,08</u> 44,57	-	1841,6	891,4	-	<u>2,412</u>	<u>48,24</u>
13	E16-22-1 K=0,4Стос	Демонтаж груп обліку	шт	2	<u>163,50</u> 154,97	<u>8,53</u> 1,44	327	309,94	<u>17,06</u> 2,88	<u>7,6949</u> 0,0593	<u>15,39</u> 0,12
14	P16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	10шт	0,4	<u>365,05</u> 179,72	<u>185,33</u> 89,83	146,02	71,89	<u>74,13</u> 35,93	<u>9,132</u> 4,5108	<u>3,65</u> 1,8
15	& C1532-28- 2	Відвод з різьб 1/2" гнтий	шт	4	<u>8,18</u>	-	32,72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	P15-168-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання та опалення діаметром 32 мм	1 шт	4	27,87 27,35	-	111,48	109,4	-	1,272	5,09
17	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,2	9,85	-	11,82	-	-	-	-
18	RH12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих труб	100м2	0,0108	2600,44 2066,96	-	28,08	22,32	-	106,38	1,15
19	P15-49-2	Демонтаж манометрів	100шт	0,02	84,49 84,49	-	1,69	1,69	-	4,572	0,09
20	P15-104-3	Установлення манометрів	к-т	2	15,90 14,99	-	31,8	29,98	-	0,708	1,42
21	C1630-1160 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	127,93	-	255,86	-	-	-	-
22	P15-112-1	Заміна паронітових прокладок діаметром до 50 мм	шт	5	34,16 26,45	-	170,8	132,25	-	1,344	6,72
23	P15-110-2	Заміна набивки сальників пробкових кранів діаметром до 30 мм	100шт	0,03	954,37 949,96	-	28,63	28,5	-	45,54	1,37
24	P15-49-3	Демонтаж термометрів	100шт	0,03	161,44 161,44	-	4,84	4,84	-	8,736	0,26
25	P15-104-4	Установлення термометрів в оправі	к-т	3	15,72 14,43	-	47,16	43,29	-	0,708	2,12
26	C1630-987	Термометри кутові в оправі	шт	3	78,24	-	234,72	-	-	-	-
27	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,009	32,92 32,92	-	0,3	0,3	-	1,956	0,02
28	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,009	73,78	73,78	0,66	-	0,66	-	-
						7,60			0,07	0,411	
		Разом прямі витрати по розділу 1					5146,89	1928,26	165,98		99,6
		Разом будівельні роботи, грн.					5146,89		74,81		3,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					3052,65				
		всього заробітна плата, грн.					2003,07				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1224,64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6371,53				

		Всього по розділу 1					6371,53				
		Разом прямі витрати по кошторису					5146,89	1928,26	<u>165,98</u>		<u>99,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5146,89		74,81		3,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					3052,65				
		всього заробітна плата, грн.					2003,07				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1224,64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142,86				
		Всього будівельні роботи, грн.					6371,53				

		Всього по кошторису					6371,53				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2145,93				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.Г. Снітко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Підприємство, організація - ТОВ «С.М.І.»
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22913310)

Замовник - Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Генпідрядник - ТОВ «С.М.І.»

Субпідрядник -

Договір № 253/14 від "19" 12 2014 р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт внутрішніх мереж: ЦО, ГВП, ХВП, каналізації в ДНЗ № 214 за адресою: вул. Котельникова, 44

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2014 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	6,79583	6,79583	6,79583
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт теплопункта	6,79583	6,79583	6,79583
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	6,66345	6,66345	6,66345
2. Інші витрати	0,13238	0,13238	0,13238
Податок на додану вартість (ПДВ)	1,35917	1,35917	1,35917
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	8,15500	8,15500	8,15500
Разом по будові (без ПДВ)	6,79583	6,79583	6,79583
Податок на додану вартість (ПДВ)	1,35917	1,35917	1,35917
Всього вартість будівельних робіт підрядника по будові з урахуванням ПДВ	8,15500	8,15500	8,15500

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбається виконавцем робіт

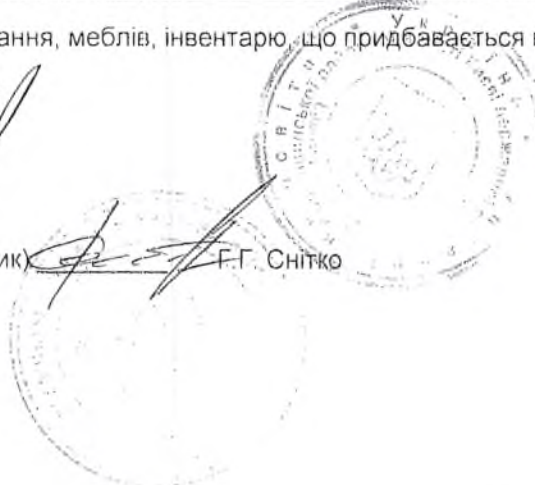
М. П. Замовник

"19" 12 2014 р.

М. П. Генпідрядник (підрядник)

Г.Г. Снітко

"19" 12 2014 р.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p align="center">Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт теплопункта в ДНЗ №214</p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p align="center">Розділ . Сантехнічні роботи</p>								
1	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	P15-40-4	100к-т	0,04	17791,35	2304,70	-	711,65	<u>4,42</u>
2	Вентиль, діаметр 25 мм В/В	C1630-226 варіант 1	шт	2	122,52	-	-	245,04	-
3	Вентиль, діаметр 32 мм В/В	C1630-227 варіант 1	шт	1	122,58	-	-	122,58	-
4	Вентиль 3-ходовий 1/2"	C1630-129-2	шт	1	77,62	-	-	77,62	-
5	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 32 мм	P15-113-2	шт	2	22,57	21,49	-	45,14	<u>2,18</u>
6	Згони в комплекті, діаметр до 32 мм	C1630-129 варіант 1	шт	2	71,50	-	-	143	-
7	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	P16-24-1	10шт	0,4	365,05	179,72	<u>185,33</u> 89,83	146,02	<u>3,65</u> 1,8
8	Резьба 1/2"	C1630-129-1	шт	4	7,24	-	-	28,96	-
9	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	P15-42-1	100м	0,015	12294,03	5026,67	-	184,41	<u>3,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-16	м	1,5	70,70	-	-	106,05	-
11	Відводи, діаметр умовного проходу 32 мм	C1532-28-1	шт	2	30,62	-	-	61,24	-
12	Перепакування	P15-76-1 Стос.	шт	20	92,08	44,57	-	1841,6	48,24
13	Демонтаж груп обліку	E16-22-1 K=0,4Стос	шт	2	163,50	154,97	8,53	327	15,39
14	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	P16-24-1	10шт	0,4	365,05	179,72	1,44	146,02	0,12
15	Відвод з різьб 1/2" гнтий	C1532-28-2	шт	4	8,18	-	89,83	32,72	3,65
16	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання та опалення діаметром 32 мм	P15-168-4	1 шт	4	27,87	27,35	-	111,48	1,8
17	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	C1630-114	кг	1,2	9,85	-	-	11,82	5,09
18	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих труб	PH12-31-11	100м2	0,0108	2600,44	2066,96	-	28,08	-
19	Демонтаж манометрів	P15-49-2	100шт	0,02	84,49	84,49	-	1,69	1,15
20	Установлення манометрів	P15-104-3	к-т	2	15,90	14,99	-	31,8	0,09
21	Манометри загального призначення	C1630-1160 варіант 1	комплект	2	127,93	-	-	255,86	1,42
22	Заміна паронітових прокладок діаметром до 50 мм	P15-112-1	шт	5	34,16	26,45	-	170,8	-
23	Заміна набивки сальників пробкових кранів діаметром до 30 мм	P15-110-2	100шт	0,03	954,37	949,96	-	28,63	6,72
24	Демонтаж термометрів	P15-49-3	100шт	0,03	161,44	161,44	-	4,84	1,37
25	Установлення термометрів в оправі	P15-104-4	к-т	3	15,72	14,43	-	47,16	0,26
26	Термометри кутові в оправі	C1630-987	шт	3	78,24	-	-	234,72	2,12
27	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	0,009	32,92	32,92	-	0,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	0,009	73,78	-	<u>73,78</u> 7,60	0,66	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							5146,89	<u>99,6</u> 3,72
								5146,89	<u>99,6</u> 3,72
I.	Разом прями витрати		грн.					5146,89	<u>99,60</u> 3,72
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					3052,65	
	- заробітна плата		грн.					1928,26	
	- вартість експлуатації машин		грн.					165,98	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					74,81	-
ii.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					1224,64	<u>4,40</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					6371,53	<u>104,00</u> 3,72
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					6371,53	<u>104,00</u> 3,72
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					291,92	
VII.	Адміністративні витрати	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					132,38	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн.					-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн. грн. грн.					- 6663,45 6795,83	<u>104,00</u> 3,72
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					6795,83	<u>104,00</u> 3,72
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1359,17	
	Всього за актом		грн.					8155,00	<u>104,00</u> 3,72
	у тому числі: зворотні суми								

- Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 2145,93 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 1928,26 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 74,81 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 142,86 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



" 01 " 04 2014 року

" 01 " 04 2014 року

" 07 " 04 2014 року
