



УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 226-20-26, факс (044) 485-19-06
E-mail: adminpodil@ukr.net Код ЄДРПОУ 37333608

08.12.17 № 106 - 9760

на № 106-150(з) від 04.12.2017

Миткалик С.
[foi+request-28747-989c9aa3@](mailto:foi+request-28747-989c9aa3@dostup.pravda.com.ua)
dostup.pravda.com.ua

Шановний Пане Сергію!

На Ваш інформаційний запит від 04.12.2017 № 106-150(з) щодо надання копій актів виконаних робіт з капітального ремонту інженерних та електричних мереж на загальну суму 130 тис. грн. в закладі дошкільної освіти № 16 за адресою: Андріївській узвіз, 4, що було виконано відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація надає копії запитуваних документів.

Додаток на 11 арк.в 1 прим

З повагою

Заступник голови

В.Смирнов



013496

Васіна
425 31 18


Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "Афінацентр"
 Договір № 120 від "17" травня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ХВП, ГВП та каналізація) будівлі ДНЗ № 16, за адресою Андріївський узвіз, 4 у Подільському районі м. Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ХВП, ГВП та каналізація) будівлі ДНЗ №16, за адресою Андріївський узвіз, 4 у Подільському районі м. Києва
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
 приймання виконаних будівельних робіт
 за М. Девенко 2017 року.

№ з / л	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі	Заробітна плата		
						Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата	Машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	Перелік нараховань:								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								

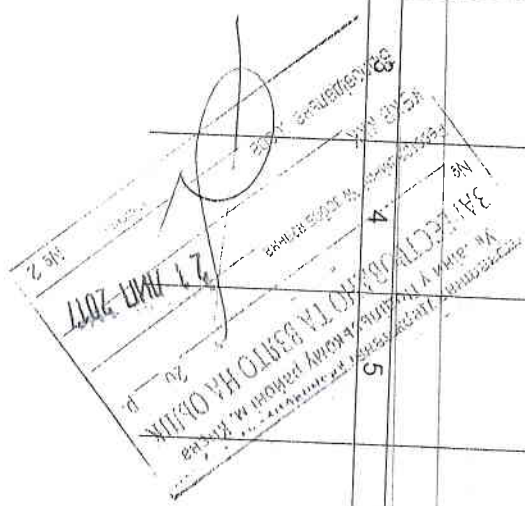

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	РН15-47-1	100шт	0,12	2312,22	2312,22	-	277,47	15,17
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	РН15-90-2	100кВт	0,2448	7057,39	2618,86	-	1727,65	32,74
3	Радіатори біметалеві 500/80 24 атм (1 секція)	С130-559-2-Р	шт	144	175,28	-	-	25240,32	-
4	Свердління отворів в залізобетонних конструкціях	варіант 1 РН20-27-7	100шт	0,13	3149,14	3093,94	55,20	409,39	18,04
5	Забивання отворів у місцях проходів труб	РН20-31-3	100шт	0,13	3793,34	3278,18	12,79	493,13	20,75
6	Улаштування екрану радіаторів	РН13-13-1 заст.	100м ²	0,1296	8198,09	1858,77	-	1062,47	11,12
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	РН15-19-2	100м	0,66	1534,99	1512,41	-	1013,09	46,78
8	Труба поліпропіленова армована алюмінієм КАС РН20 25 мм	С113-1352-42-4Х	м	66	42,87	-	-	2829,42	-
9	Коліно 90 град. 25Х25 мм	варіант 7 С113-1705-2-П	шт	38	17,56	-	-	667,28	-
10	Коліно 45 град. 25Х25 мм	варіант 2 С113-1705-2-П	шт	8	9,00	-	-	72	-
11	Муфта 25Х3/4	варіант 3 С1630-138-37	шт	39	61,34	-	-	2392,26	-
12	Трійник Ду25	варіант 3 С1630-138-37	шт	3	35,43	-	-	106,29	-
13	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	варіант 2 РН15-73-1	прилад	13	6,16	6,16	-	80,08	3,9
14	Служання води із системи	РН15-46-3	100м	0,66	7,69	7,69	-	5,08	0,29
15	Заповнення системи водою з оглядом	РН15-46-2	100м	0,66	59,56	59,56	-	39,31	2,21
16	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	РН16-22-1	100м	0,66	84,13	84,13	-	55,53	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	РН15-30-1	100м	0,66	353,87	341,03	-	233,55	8,85
18	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	РН15-29-1	шт	13	309,23	164,71	-	4019,99	101,87
19	Розбирання перегородок із гіпсових плит	РН5-2-1	100 м2	0,35	1156,81	1156,81	-	404,88	23,87
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	РН15-19-1	100м	0,12	1471,16	1449,16	-	176,54	8,15
21	Труба поліпропіленова армована агломератом КАС РН20 20 мм	С113-1352-42-4Х	м	12	32,67	-	-	392,04	-
22	Муфта ППР 20х1/2" нр	С1530-154-178	шт	8	30,92	-	-	247,36	-
23	Муфта ППР 20х1/2" зр	варіант 1 С1530-154-178	шт	4	30,92	-	-	123,68	-
24	Коліно ППР 20	варіант 2 С1530-154-178	шт	20	18,68	-	-	373,6	-
25	Муфта ППР 20х20	варіант 3 С1530-154-178	шт	20	9,50	-	-	190	-
26	Трійник ППР 25х20х25	варіант 4 С1530-154-178	шт	2	16,64	-	-	33,28	-
27	Редукція ППР 25х20	варіант 5 С1530-154-178	шт	2	8,31	-	-	16,61	-
28	ПП кліпса 20	варіант 6 С1530-154-178	шт	20	5,42	-	-	108,4	-
29	ПП кліпса 25	варіант 7 С1530-154-178	шт	20	8,07	-	-	161,4	-
		варіант 8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Муфта ППР 25х1/2	С113-14601-13 варіант 2	шт	2	35,76	-	-	71,52	-
31	Установлення муфтових кранів водорозбірних	РН15-22-1	100 шт	0,36	2032,80	1248,59	-	734,84	21,38
32	Крани кульові, діаметр 1/2" нв з американкою КОЕР	С1630-670-1 варіант 1	шт	12	122,41	-	-	1468,92	-
33	Кран шаровий американка 3/4"	С130-475-1 варіант 9	шт	24	163,35	-	-	3920,4	-
34	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	РН20-27-7	100шт	0,06	3149,14	3093,94	55,20	188,95	8,33
35	Забивання отворів у місцях проходів труб	РН20-31-3	100шт	0,06	3793,34	3278,18	12,79	227,6	0,04
36	Прочищення магістральних трубопроводів системи центрального опалення	РН15-71-3	10м	5,5	178,71	178,71	-	982,91	49,57
37	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	РН15-29-1	шт	4	309,23	164,71	-	1236,92	31,34
38	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	РН20-28-2	100м	0,27	912,34	778,97	-	246,33	10,48
39	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	РН20-28-4	100м	0,27	701,79	612,87	42,67	189,48	0,5
40	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	РН20-33-4	100м	0,27	622,05	521,86	28,45	167,95	0,33
41	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	РН20-33-6 К=5	100м	0,27	731,55	489,24	3,26	197,52	7,29
42	Очищення приміщень від сміття	РН20-36-1	100т	0,0336	6261,08	6261,08	-	210,37	-
43	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	3,36	33,17	33,17	-	111,45	6,57
44	Перевезення сміття до 30 км	СЗ11-30-М	т	3,36	110,77	-	110,77	372,19	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							9,56	53276,42	1,38
Разом прями витрати			грн.					53276,42	470,51
У тому числі:			грн.						2,38
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій			грн.					43277,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- заробітна плата - вартість експлуатації машин У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн. грн.					9555,29 443,58	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					54,53	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					3966,29	2,38
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					57242,71	491,74
V.	У тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати У тому числі: - Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013 Дод. К п. 50	грн. грн.					1128,00	2,38
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					58370,71	491,74
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013	грн.					1339,07	2,38
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013	грн.					607,77	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					58581,78	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					60317,55	491,74
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					-	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					60317,55	491,74
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013 п.5.8.16	грн.					12063,51	2,38
	Всього за актом		грн.					72381,06	491,74 2,38

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в колгосписах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10301,22 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9555,29 грн.;


- зарплата в експлуатації машин: 54,53 грн.;

- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 691,4 грн.



М. П. Замовник

[Handwritten signature]




М. П. Замовник
"14" 02 2017 року


М. П. Підрядник

Василенко С.М.

"14" 02 2017 року



ПОГОДЖЕНО
Технічний надзор
Замовителю В.С.



Підприємство, організація - ТОВ "Теплоенергетика"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (35612005)
 Замовник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "Теплоенергетика"

Договір № 131 від "22" травня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт електричних мереж електрошитових в ДНЗ №16 за адресою Андріївський узвіз, 4, Подільського району міста Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт електричних мереж електрошитових в ДНЗ №16 за адресою Андріївський узвіз, 4, Подільського району міста Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за *ММММ* 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	У тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати трудоза робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатаційна машина та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	на Капітальний ремонт електричних мереж електрошитових в ДНЗ №16 за адресою Андріївський узвіз, 4, Подільського району міста Києва								
	Розділ . Шитова								
1	Демонтаж увідно-розподільних пристроїв	РН17-13-1 к=0,4	1 шафа	1	147,92	123,57	<u>24,30</u> 0,75	148	<u>5,7</u> 0,04
2	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	РН17-13-1	1 шафа	1	421,10	308,93	<u>60,74</u>	421	<u>14,26</u>

ММММ

ММММ

ГО 1_2-1_під_КБЗв

Примірна форма № КБ-2в

ММММ

								70_1_2-1_ГД_КБ2в		
3	Корпус ШИТА розподільного 1050x520x200	1517-2039 варіант 15	шт	1	3872,49	-	-	1,88	3872	0,09
4	Панель монтажна М6 150	1517-2071 варіант 1	шт	2	105,98	-	-	-	212	-
5	Стойка монтажна	1517-2071 варіант 4	шт	2	156,98	-	-	-	314	-
6	Монтаж ізолятора опорного	М8-52-2	шт	4	15,91	15,89	-	-	64	3,02
7	Ізолятор SM-40	15102-4001 варіант 1	шт	4	17,43	-	-	-	70	-
8	Демонтаж вимикачів автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	М8-526-1 к=0,3	шт	16	12,11	12,11	-	-	194	9,22
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	М8-526-1	шт	16	44,34	40,36	-	-	709	30,72
10	Вимикач автоматичний 1Р 16А	1504-1027 варіант 9	шт	12	59,72	-	-	-	717	-
11	Вимикач автоматичний 3Р 16А	1504-1027 варіант 11	шт	2	543,24	-	-	-	1086	-
12	Вимикач автоматичний 3Р 25А	1504-1027 варіант 13	шт	2	543,24	-	-	-	1086	-
13	Демонтаж вимикачів автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	М8-526-2 к=0,3	шт	7	21,19	21,19	-	-	148	7,06
14	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	М8-526-2	шт	7	83,38	70,63	-	-	584	23,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- вартість експлуатації машин У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					85,00	
II.	Загальновиrobничі витрати	Розрахунок	грн.					3,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						0,13
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						17,73
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					43963,00	-
V.	У тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати		грн.						-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					43963,00	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-	грн.					544,00	200,52 0,13
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	1:2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-	грн.					247,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	1:2013 п.5.8.16	грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					44507,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					44754,00	200,52 0,13
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості								
	будівництва (без ПДВ)		грн.					44754,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					8950,80	200,52 0,13
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)			-5-					70.1.2-1.ГД.К52в	
Всього за актом			грн.					53704,80	200,52 0,13



Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
- Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 4380 грн.;
- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 3800 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 3 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 577 грн.

М. П. ЗАМОВНИК

Качалович Ірина Євгенівна
" 04 " 08 2017 року

О.І. Ложко " 04 " 08 2017 року



ПОГОДЖЕНО
Технічний розрахунок
Замовлювачем В.С.



Юхименко Дмитро
" 04 " 08 2017 року

