



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, м. Київ, 01010, тел. (044) 280-89-12 факс (044) 280-40-96
e-mail: letter@pechrda.gov.ua, web-сайт: pechersk.kievcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 37401206

24.01.2018 № 205/03-196(з)/20
На № 196(з) від 18.01.2018

С. Миткалик
foi+request-30204-83ce72a8@dostup.pravda.com.ua

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації

За дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.01.2018 № 196(з), в Печерській районній в місті Києві державної адміністрації розглянуто ваш запит щодо надання інформації про стан виконання робіт по заміні вікон відповідно до «Програми соціального та економічного розвитку міста Києва на 2017 рік» за адресою: вул. Драгомирова, 8.

Повідомляємо, що згідно з розпорядженням № 41 від 17.01.2017 замовником робіт «Програми соціального та економічного розвитку міста Києва на 2017 рік» визначено Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Надаємо запитувану інформацію в додатках.

Додаток на 11 аркушах у 1 примірнику.

Заступник голови

А. Невмержицкий

18259

Підприємство, організація - ТОВ "Укрмонтажлюкс"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33147770)
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства та
 будівництва Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "Укрмонтажлюкс"

Договір № 60 від "19.05.2017"

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за Вересень 2017 р.

560/2

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	124,36250	124,36250	7,42250
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва	124,36250	124,36250	7,42250
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	122,91762	122,91762	7,24662
2. Інші витрати	1,44488	1,44488	0,17588
Податок на додану вартість (ПДВ)	24,87250	24,87250	1,48450
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	149,23500	149,23500	8,90700

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт



М. П. Замовник

Мазур А.І.

" 11 " Вересень 2017 року

М. П. Підрядник

Максименко О.В.

" 11 " Вересень 2017 року

Підприємство, організація - ТОВ "Укрмонтажлюкс"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33147770)
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства та
 будівництва Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "Укрмонтажлюкс"

Договір № 60 від "19.05.2017" року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 60/а
приймання виконаних будівельних робіт
 за вересень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	на Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва								
	Розділ . Оздоблення внутрішніх укосів								
1	Облицювання укосів листами сухої шпугатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	РН11-39-2	100м2	0,276	6468,43	6468,43	-	1785,29	93,42
2	Клей для гіпсокартону Перлфікс	С1113-296-4 варіант 1	кг	110,4	3,24	-	-	357,67	-
3	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5 мм	С1111-741 варіант 1	м2	29	33,03	-	-	957,87	-
4	Безпіщане накриття відкосів стін	РН11-59-3	100м2	0,276	1332,40	1264,98	-	367,74	16,61
5	Грунтовка вододispersійна СТ-17	С1111-1624-1 варіант 3	кг	4,14	16,64	-	-	68,89	-
6	Шпаклівка Сатенгіпс	С1111-1896 варіант 1	кг	33,12	4,32	-	-	143,08	-
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоемульсійна	РН12-49-5	100м2	0,276	1068,26	1042,98	-	294,84	14,52
8	Безпіщане накриття підвіконників	С1111-1624-1 варіант 1	кг	17,39	69,96	-	-	1216,6	-
9	Шпаклівка Сатенгіпс	РН11-59-3	100м2	0,067	1332,40	1264,98	-	89,27	4,03
10	Грунтовка вододispersійна СТ-17	С1111-1896 варіант 1	кг	8,04	4,32	-	-	34,73	-
11		С1111-1624-1 варіант 3	кг	1,005	16,64	-	-	16,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Просте фарбування колером олійним підвіконь, підготовлення під фарбування, поштукатурці та збірних конструкціях Разом по розділу Оздоблення внутрішніх укосів	РН12-39-8	100м2	0,067	2683,87	844,76	-	179,82	2,85
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							5512,52	131,43
I.	Разом прями витрати		грн.					5512,52	131,43
	У ТОМУ числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					2948,89	
	- заробітна плата		грн.					2563,63	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	У ТОМУ числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					1346,60	11,56
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					6859,12	142,99
V.	У ТОМУ числі: зворотні суми Інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					6859,12	142,99
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					387,50	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					175,88	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					7246,62	-
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					7422,50	142,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Х.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X)		грн.					7422,50	142,99
ХІ.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1484,50	-
	Всього за актом		грн.					8907,00	<u>142,99</u>

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітня плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 2940,45 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2563,63 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальнопробних витрат: 376,82 грн.

М. П. Замовник


М. П. Пдрядник

Мазур А.І.

Максименко О.В.

" 11 " 09 2017 року

" 11 " 09 2017 року

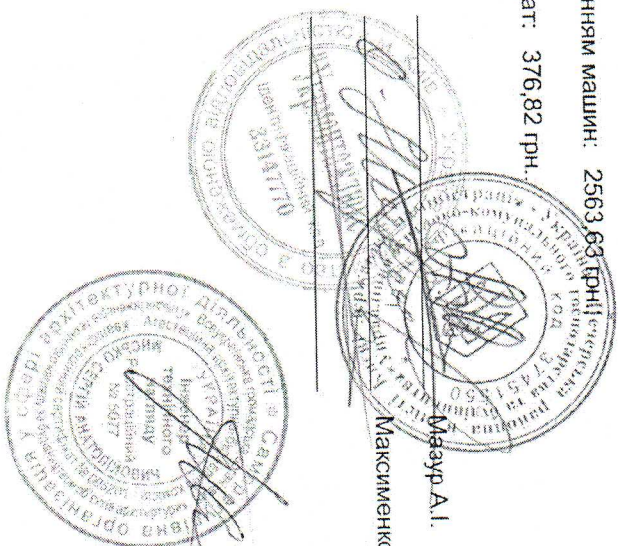

Підприємство, організація - ТОВ "Укрмонтажлюкс"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33147770)
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства та
 будівництва Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "Укрмонтажлюкс"

Договір № 60 від "19.05.17"

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за травень 2017 р.

860/1

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
	1	2	3
A			
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	116,94000	116,94000	116,94000
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва	116,94000	116,94000	116,94000
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	115,67100	115,67100	115,67100
2. Інші витрати	1,26900	1,26900	1,26900
Податок на додану вартість (ПДВ)	23,38800	23,38800	23,38800
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	140,32800	140,32800	140,32800

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник  Мазур А.І.

" 01 " червня 2017 року

М. П. Підрядник  Максименко О.В.

" 01 " червня 2017 року



Управління Державної казначейської служби України
 у Печерському районі м. Києва


ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

" 19 " травня 2017 року

Реєстраційний № зобов'язання _____

КЕКВ/КККБ _____

Відповідальна особа № 12 _____



Підприємство, організація - ТОВ "Укрмонтажлюкс"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33147770)
Замовник - Управління житлово-комунального господарства та
будівництва Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
Підрядник - ТОВ "Укрмонтажлюкс"

Договір № 60 від 19.05.2017 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 60/1 в.р. 01.06.2017
приймання виконаних будівельних робіт
за Добрий 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднуван- ня (цифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.		
						у тому числі					
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів				
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Покальний кошторис 2-1-1								
	на Капітальний ремонт (заміна вікон) у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 8 у Печерському районі міста Києва Розділ . Прорізи								
1	Знімання заскленних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,47972	1191,75	1191,75	-	572	32,74
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шугатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,18	3406,71	3406,71	-	613	34,47
3	Розбирання відливів з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,2096	292,66	292,66	-	61	3,62
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластикової будівельної металопластикової	ЕН10-20-1 Н2,Н5=1,15	100м2	0,01441	5649,21	5634,52	-	81	3,8
5	Блоки віконні металопластикові	С123-214 варіант 1	м2	1,441	2081,84	-	-	3000	-
6	Елементи кріплення віконної рами	С111-140Д варіант 2	шт	12	3,98	-	-	48	-
7	Монтажна піна	С111-72-1А	л	0,81	164,05	-	-	133	-
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластикової будівельної металопластикової	ЕН10-20-3 Н2,Н5=1,15	100м2	0,46531	3394,43	3389,69	-	1579	72,79
9	Блоки віконні металопластикові	С123-214 варіант 1	м2	46,531	2081,84	-	-	96870	-
10	Елементи кріплення віконної рами	С111-140Д варіант 2	шт	181	3,98	-	-	720	-
11	Монтажна піна	С111-72-1А	л	13,7	164,05	-	-	2247	-
12	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 Н2,Н5=1,15	100м	0,2096	719,95	719,95	-	151	7,9
13	Зливи 200 мм	С111-1801-1 варіант 23	м	21,7	80,82	-	-	1754	-
14	Шурупи 3,5х9,5	С111-1477-1-О	шт	74	0,27	-	-	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Установлення віконних нащільників	ЕН10-25-4 Н2,Н5=1,15	100м	0,9337	719,95	719,95	-	672	35,18
16	Нащільник 70мм	С111- 1801-1	м	96,82	39,18	-	-	3793	-
17	Шурупи 3,5х9,5	варіант 7 С111- 1477-1-О	шт	330	0,27	-	-	89	-
	Разом по розділу Прорізи							112403	190,5
	Розділ . Інші роботи								
18	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	2,129	33,17	33,17	-	71	4,16
19	Перевезення сміття до 30 км без урахування вартості навантаження	С311-30-М варіант 1	т	2,129	110,77	-	110,77 9,56	236	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							112710	194,66 0,88
I.	Разом прями витрати		грн.					112710,00	194,66
	У тому числі:								0,88
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					108676,00	
	- заробітна плата		грн.					3798,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					236,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					20,00	
II.	Загально виробничі витрати	Розрахунок	грн.					2367,00	0,88
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	23,47
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
