

Підприємство, організація - ТОВ «ГРІН ТРЕЙДІНГ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40729651)

Замовник - Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"

Договір № 11 від "14" березня 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*


за липень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	146,83300	146,83300	146,83300
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва	146,83300	146,83300	146,83300
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	142,19609	142,19609	142,19609
2. Інші витрати	4,63691	4,63691	4,63691
Податок на додану вартість (ПДВ)	29,36660	29,36660	29,36660
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>176,19960</b>	<b>176,19960</b>	<b>176,19960</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник



Корбецький М.Б.

" 17 " 07 20 17 року

М. П. Підрядник



Руденко М.В.

" 17 " 07 20 17 року

Підприємство, організація - ТОВ «ГРІН ТРЕЙДІНГ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40729651)

Замовник – Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"


Договір № 11 від "14"березня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва

Підстава: Договірна ціна

**АКТ № 122**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
**за липень 2017 року**



№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4
	<p align="center"><b><u>Локальний кошторис</u></b> <b><u>2-1-1</u></b> <b><u>на Капітальний ремонт сходових клітин</u></b> <b><u>житлового будинку за адресою: вул.</u></b> <b><u>Олійника, 7 у Дарницькому районі міста</u></b> <b><u>Києва</u></b></p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=1</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=1</p> <p align="center"><b><u>Розділ . Стелі</u></b></p>		
1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 к=1,15	100 м2
2	Шпаклівка Сатенгіпс Кнауф	С111-1896 варіант 12	кг
3	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	С111-1624- 1 варіант 25	кг
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	PH12-65-14	100м2
5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 к=1,15	100 м2

5	6	7	8	9	10
-2,717	2363,94	2204,80	-	-6422,82	<u>-236.22</u>
-407,55	3,84	-	-	-1564,99	-
-81,51	27,76	-	-	-2262,72	-
2,3	915,79	915,79	-	2106,32	<u>102.95</u>
5,017	2363,94	2204,80	-	11859,89	<u>436.18</u>

1	2	3	4
6	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-6 к2, к5=1,15	100 м2
7	Шпаклівка Сатенгіпс Кнауф	C111-1896 варіант 12	кг
8	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	C111-1624- 1	кг
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-6	100м2
10	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт	C111-1626- 1	кг
	Разом по розділу Стелі	варіант 12	
	<b><u>Розділ . Стіни</u></b>		
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	PH12-65-13	100м2
12	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 к2,5 =1,15	100 м2
13	Шпаклівка Сатенгіпс Кнауф	C111-1896 варіант 12	кг
14	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	C111-1624- 1	кг
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	PH12-65-13	100м2
16	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 к2,5 =1,15	100 м2
17	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (2мм)	EH15-56-4 к2, к5=1,15 к=2	100 м2
18	Шпаклівка Сатенгіпс Кнауф	C111-1896 варіант 12	кг

## 1132\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в

5	6	7	8	9	10
5,017	515,65	461,96	-	2587,02	<u>91.39</u>
1003,4	3,84	-	-	3853,06	-
150,51	27,76	-	-	4178,16	-
2,3	1460,02	1416,26	-	3358,05	<u>136.18</u>
92	38,00	-	-	3496	-
				21187,97	<u>530.48</u>
21,277	721,09	721,09	-	15342,63	<u>749.89</u>
-9,531	1489,17	1383,07	-	-14193,28	<u>-519.8</u>
-953,1	3,84	-	-	-3659,9	-
-285,93	27,76	-	-	-7937,42	-
4,5	721,09	721,09	-	3244,91	<u>158.6</u>
14,031	1489,17	1383,07	-	20894,54	<u>765.22</u>
14,031	842,07	732,83	<u>1.86</u> 1,60	11815,08	<u>405.46</u> 0,86
2806,2	3,84	-	-	10775,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	C111-1624-1	кг	420,93	27,76	-	-	11685,02	-
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2	4,5	1297,89	1258,10	-	5840,51	<u>236.68</u>
21	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт з тонуванням	C111-1626-1	кг	180	50,56	-	-	9100,8	-
	Разом по розділу Стіни	варіант 13						62908,7	<u>1796.05</u> 0,86
	<b><u>Розділ . Підлоги</u></b>								
22	Розбирання дерев'яних плінтусів	PH7-3-1	100м	2,1	146,33	146,33	-	307,29	<u>15.02</u>
23	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	PH7-2-6	100м2	2,55	958,02	958,02	-	2442,95	<u>119.4</u>
24	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	EH11-11-13	100м2	2,55	2218,26	1974,37	-	5656,56	<u>224.16</u>
		к=1,15/Н2, Н5/							
25	Суміш суха Ceresit CN-69	C111-488-12	кг	1377	6,70	-	-	9225,9	-
	Разом по розділу Підлоги	варіант 1						17632,7	<u>358.58</u>
	<b><u>Розділ . Інші роботи</u></b>								
26	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	1,019	40,02	40,02	-	40,78	<u>1.99</u>
27	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	C311-30-M	т	1,019	112,74	-	<u>112.74</u> 11,53	114,88	- 0,42
								155,66	<u>1.99</u> 0,42
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							101885,03	<u>2687.1</u> 1,28
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>101885,03</b>	<b><u>2687.10</u></b> <b>1,28</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					40410,83	
	- заробітна плата		грн.					61333,22	

1	2	3	4
	- вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.
III.	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.
IV.	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.
	у тому числі: зворотні суми		грн.
V.	<b>Інші супутні витрати</b> у тому числі: - Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн.
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.
VI.	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.
VII.	<b>Адміністративні витрати (1,23)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.
VIII.	<b>Кошти на покриття ризиків</b>		грн.
IX.	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		грн. грн.
X.	<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)</b>		грн.



## 1132\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в

5	6	7	8	9	10
				140,98	
				34,20	-
				<b>32353,12</b>	<u>1,28</u>
					<b>248.13</b>
				-	-
				-	-
				<b>134238,15</b>	<u>2935.23</u>
					1,28
				-	
				<b>1025,00</b>	
				1025,00	
				<b>135263,15</b>	<u>2935.23</u>
					1,28
				<b>7957,94</b>	
				<b>3611,91</b>	
				-	
				-	
				142196,09	
				<b>146833,00</b>	<u>2935.23</u>
					1,28
				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>		грн.					<b>146833,00</b>	<b>2935.23</b>
<b>XI.</b>	<b>Податок на додану вартість</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					<b>29366,60</b>	<b>1,28</b>
	<b>Всього за актом</b>		грн.					<b>176199,60</b>	<b>2935.23</b>
									<b>1,28</b>


Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 71118,91 грн.,  
 у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 61333,22 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 34,2 грн.;  
 - зарплата у складі загальновидавничих витрат: 9751,49 грн..



М. П. ~~Замовник~~  
 М. П. Генпідрядник (підрядник)  
 М. П. Субпідрядник

*[Handwritten signature]*  
 Руденко М.В.

" 18 " 07 2017 року  
 " 18 " 07 2017 року  
 " " " 20\_\_ року



*[Handwritten signature]*



Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва

**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі**  
**міста Києва**  
**(витрати - за прийнятими нормами)**

Звітний період 1 (липень 2017 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.							
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2687,1	22,83					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,86	26,11					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,42	28,05					
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
6.1		загальновиробничих витрат	люд-год	248,13	39,30					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	2936,51						
		Середній розряд робіт	розряд	3,4						

1	2	3	4
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>	
7	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год
8	+*С311-30-М варіант 6	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	т
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<b><u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>	
9	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год
10	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год
		<b><u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u></b>	
11	&С111-488-12 варіант 1	Суміш суха Ceresit CN-69	кг
12	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2
13	+С111-1624-1 варіант 25	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	кг
14	&С111-1624- 1-1	Грунтовка дисперсійна Thomsit RS-777	кг
15	+С111-1626-1 варіант 12	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт	кг
16	+С111-1626-1 варіант 13	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт з тонуванням	кг
17	+С111-1896 варіант 12	Шпаклівка Сатенгіпс Knauf	кг

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,7745112	<u>33.75</u>				
	26,14				
1,019	<u>112.74</u>				
	114,88				
	<b>141,02</b>				
0,349					
0,023					
40,416819					
67,038					
1377	<u>6,7</u>	<u>4.97</u>	<u>1,6</u>	<u>0.13</u>	
	9225,90	6843,69	2203,20	179,01	
21,7006	<u>132.62</u>	<u>130.00</u>	<u>0.02</u>	<u>2,6</u>	30 км.
	2877,93	2821,08	0,43	56,42	
204	<u>27.76</u>	<u>27.00</u>	<u>0.22</u>	<u>0.54</u>	30 км.
	5663,04	5508,00	44,88	110,16	
50,235	<u>12.38</u>	<u>12.00</u>	<u>0,14</u>	<u>0.24</u>	30 км.
	621,91	602,82	7,03	12,06	
92	<u>38</u>	<u>37.08</u>	<u>0.17</u>	<u>0.75</u>	30 км.
	3496,00	3411,36	15,64	69,00	
180	<u>50.56</u>	<u>49.40</u>	<u>0.17</u>	<u>0.99</u>	30 км.
	9100,80	8892,00	30,60	178,20	
2448,95	<u>3.84</u>	<u>3.60</u>	<u>0.16</u>	<u>0.08</u>	30 км.
	9403,97	8816,22	391,83	195,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C142-10-2	Вода	м3	1,223923	17,3 21,17	17,30 21,17	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
19	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,9751	-	-			
		<b>Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	<b>грн.</b>		<b>40410,72</b>	<b>36916,34</b>	<b>2693,61</b>	<b>800,77</b>	
		Електроенергія	кВт-год	17,324					
		Мастильні матеріали	кг	0,023					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





Підприємство, організація - ТОВ «ГРІН ТРЕЙДІНГ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40729651)

Замовник - Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ «ГРІН ТРЕЙДІНГ»

Субпідрядник -

Договір № 11 від 14 березня 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ**

за квітень 2017 р.

Україна, м. Київ  
Зареєстровано та взято на облік

10 ТРА 2017

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	289,60914	289,60914	289,60914
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва	289,60914	289,60914	289,60914
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	269,34034	269,34034	269,34034
2. Інші витрати	20,26880	20,26880	20,26880
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт</b>	<b>289,60914</b>	<b>289,60914</b>	<b>289,60914</b>
Виключається сума отриманого авансу	86,95476	86,95476	86,95476
<b>Всього вартість будівельних робіт по будові</b>	<b>202,65438</b>	<b>202,65438</b>	<b>202,65438</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник  Корбецький М.В.

" 05 " 05 2017 року

М. П. Підрядник  Руденко М.В.

" 05 " 05 2017 року





1	2	3	4
	<p align="center"><b><u>Локальний кошторис</u></b> <b><u>2-1-1</u></b> <b><u>на Капітальний ремонт сходових клітин</u></b> <b><u>житлового будинку за адресою: вул.</u></b> <b><u>Олійника, 7 у Дарницькому районі міста</u></b> <b><u>Києва</u></b></p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>		
	<b><u>Розділ . Стелі</u></b>		
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	РН12-65-14	100м2
2	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 к=1,15	100 м2
3	Шпаклівка Сатенгіпс Knauf	С111-1896 варіант 3	кг
4	Грунтовка Бетоноконтатк Cerezit СТ-19	С111-1624- 1 варіант 3	кг
5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 к=1,15	100 м2
6	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	ЕН15-56-6 к=1,15	100 м2
7	Шпаклівка Сатенгіпс Knauf	С111-1896 варіант 3	кг

5	6	7	8	9	10
5,094	759,13	759,13	-	3867,01	<u>228,01</u>
2,717	2021,55	1827,48	-	5492,55	<u>236,22</u>
407,55	4,57	-	-	1862,5	-
81,51	33,27	-	-	2711,84	-
2,377	2021,55	1827,48	-	4805,22	<u>206,66</u>
2,377	448,42	382,90	<u>0,81</u> 0,66	1065,89	<u>43,3</u> 0,07
475,4	4,57	-	-	2172,58	-

1	2	3	4
8	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	C111-1624-1	кг
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 3 PH12-49-6	100м2
10	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт	C111-1626-1	кг
	Разом по розділу Стелі	варіант 2	
	<b><u>Розділ . Стіни</u></b>		
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	PH12-65-13	100м2
12	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 к=1,15	100 м2
13	Шпаклівка Сатенгіпс Knauf	C111-1896	кг
14	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	варіант 3 C111-1624-1	кг
15	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 3 EH15-56-3	100 м2
16	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	к=1,15 EH15-56-4	100 м2
17	Шпаклівка Сатенгіпс Knauf	C111-1896	кг
18	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	варіант 3 C111-1624-1	кг
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 3 PH12-49-5	100м2
20	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт з тонуванням	C111-1626-1	кг
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь відкосів стін від вапняної фарби	варіант 3 PH12-65-13	100м2

## 965\_1 2-1\_ПД\_КБ2в

5	6	7	8	9	10
71,31	33,27	-	-	2372,48	-
5,094	1226,61	1174,09	-	6248,35	<u>301.61</u>
203,76	45,56	-	-	9283,31	-
				39881,73	<u>1015.8</u> 0,07
18,677	597,74	597,74	-	11163,99	<u>658.25</u>
9,531	1275,70	1146,38	-	12158,7	<u>519.8</u>
953,1	4,57	-	-	4355,67	-
285,93	33,27	-	-	9512,89	-
9,146	1275,70	1146,38	-	11667,55	<u>498.8</u>
9,146	710,23	607,42	<u>1.63</u> 1,33	6495,76	<u>264.29</u> 0,56
1829,2	4,57	-	-	8359,44	-
274,38	33,27	-	-	9128,62	-
18,677	1090,72	1042,98	-	20371,38	<u>982.34</u>
747,08	60,64	-	-	45302,93	-
0,1376	597,74	597,74	-	82,25	<u>4.85</u>

1	2	3	4
22	Безпіщане накриття поверхонь відкосів стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 к=1,15	100 м2
23	Шпаклівка Сатенгіпс Кнауф	С111-1896 варіант 3	кг
24	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	С111-1624- 1 варіант 3	кг
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2
26	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт з тонуванням	С111-1626- 1 варіант 3	кг
	Разом по розділу Стіни		
	<b><u>Розділ . Електрика</u></b>		
27	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	РН17-4-3	100шт
28	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	РН17-5-3	100м
29	Трижильний кабель перерізом 3x1,5мм2 ВВП	15093- 35013 варіант 1	1000м
30	Монтаж світильник підвісного для ламп розжарювання	РН17-10-1	100шт
31	Світильник антивандальний Feron світлодіодний 100Вт Разом по розділу Електрика	С1547-7 варіант 1	шт
	<b><u>Розділ . Інші роботи</u></b>		
32	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т

## 965\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в

5	6	7	8	9	10
0,1376	1275,70	1146,38	-	175,54	<u>7,5</u>
13,76	4,57	-	-	62,88	-
4,128	33,27	-	-	137,34	-
0,1376	1090,72	1042,98	-	150,08	<u>7,24</u>
5,504	60,64	-	-	333,76	-
				139458,78	<u>2943,07</u> 0,56
0,75	185,01	185,01	-	138,76	<u>7,45</u>
1,5	712,52	703,67	-	1068,78	<u>54,58</u>
0,15	16648,48	-	-	2497,27	-
0,75	2164,45	2140,65	-	1623,34	<u>74,09</u>
75	550,93	-	-	41319,75	-
				46647,9	<u>136,12</u>
0,276	33,17	33,17	-	9,15	<u>0,54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	С311-30-М варіант 1	т	0,276	110,77	-	<u>110,77</u> 9,56	30,57	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							39,72	0,11
								226028,13	<u>0,54</u> 0,11
									<u>4095,53</u> 0,74
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>226028,13</b>	<b><u>4095,53</u></b> <b>0,74</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					145111,03	
	- заробітна плата		грн.					80869,69	
	- вартість експлуатації машин		грн.					47,41	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					16,37	-
									<u>0,74</u>
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>31807,18</b>	<b><u>149,13</u></b> -
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-
<b>IV.</b>	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>							-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>257835,31</b>	<b><u>4244,66</u></b> <b>0,74</b>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
<b>V.</b>	<b>Інші супутні витрати</b>		грн.					<b>566,50</b>	
	у тому числі:								
	- Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн.					566,50	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>258401,81</b>	<b><u>4244,66</u></b> <b>0,74</b>
<b>VI.</b>	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					<b>11505,03</b>	
		п.5.8.16							
<b>VII.</b>	<b>Адміністративні витрати (1,23)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					<b>5221,84</b>	
		п.5.8.16							
<b>VIII.</b>	<b>Кошти на покриття ризиків</b>		грн.					-	

1	2	3	4
IX.	<p>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</p> <p>Всього вартість будівельних робіт</p> <p>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</p>		грн.
X.	<p>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції</p> <p>1. Разом</p> <p>2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів</p> <p>3. Зворотні суми</p> <p>4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п. 1-п.2-п.3)</p> <p>- Єдиний податок за ставкою 5%</p> <p>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</p>	Розрахунок N П-137	<p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p>



5	6	7	8	9	10
				269340,34	
				275128,68	<u>4244,66</u>
					0,74
				275128,68	
				275128,68	
				14480,46	
				289609,14	<u>4244,66</u>
					0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Всього за актом</b>		грн.					<b>289609,14</b>	<b>4244,66</b>
	у тому числі: зворотні суми								<b>0,74</b>


Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 85744,85 грн.,  
 у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 80869,69 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 16,37 грн.;  
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 4858,79 грн..

М. П. Замовник

" 05 " 05 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

" 05 " 05 2017 року

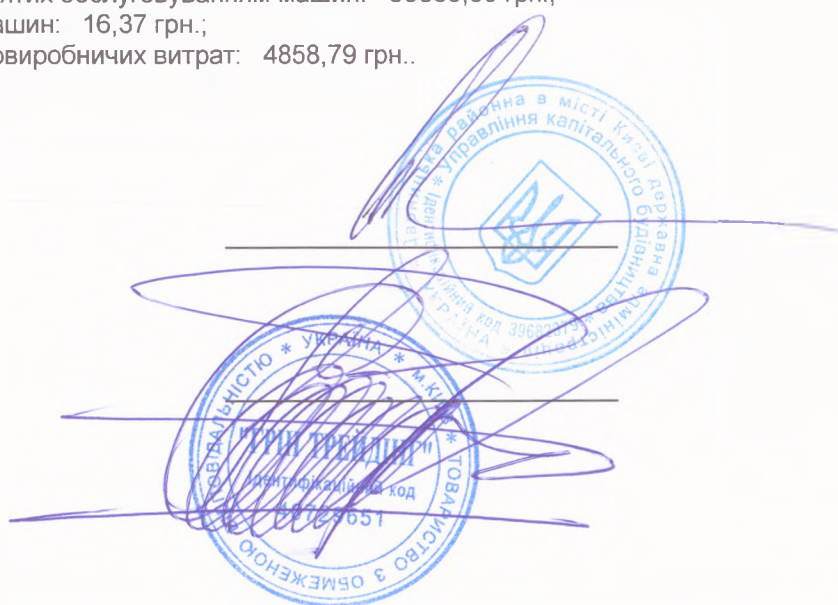

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі міста Києва

**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Олійника, 7 у Дарницькому районі**  
**міста Києва**  
**(витрати - за прийнятими нормами)**

Звітний період 1 (квітень 2017 г.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець			Обґрунтування ціни	
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.							
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3959,41	19,72					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	136,12	20,57					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,63	21,69					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд-год	0,11	23,26					
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
8.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	149,13	32,58					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	4245,4						
		Середній розряд робіт	розряд	3,4						

1	2	3	4
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>	
9	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год
10	+*С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	т
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<b><u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>	
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год
12	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год
13	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год
		<b><u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u></b>	
14	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т
15	С111-1604	Папір шліфувальний	м2
16	+С111-1604 варіант 27	Папір шліфувальний	м2
17	+С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка Бетоноконтакт Cerezit СТ-19	кг
18	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт	кг
19	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна "Колорит" Стандарт з тонуванням	кг

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,5704644	<u>29,51</u>				
	16,83				
0,276	<u>110,77</u>				
	30,57				
	<b>47,40</b>				
0,257					
0,017					
44,56289376					
229,2752472					
4,446					
0,00075	<u>3200.03</u>	<u>3000.00</u>	<u>137.28</u>	<u>62.75</u>	30 км.
	2,40	2,25	0,10	0,05	
7,3168	<u>123.84</u>	<u>121.39</u>	<u>0.02</u>	<u>2.43</u>	30 км.
	906,11	888,19	0,15	17,77	
29,44068	<u>159.14</u>	<u>156.00</u>	<u>0.02</u>	<u>3.12</u>	30 км.
	4685,19	4592,75	0,59	91,85	
717,258	<u>33,27</u>	<u>32,40</u>	<u>0,22</u>	<u>0,65</u>	30 км.
	23863,17	23239,16	157,80	466,21	
203,76	<u>45,56</u>	<u>44,50</u>	<u>0,17</u>	<u>0,89</u>	30 км.
	9283,31	9067,32	34,64	181,35	
752,584	<u>60,64</u>	<u>59,28</u>	<u>0,17</u>	<u>1,19</u>	30 км.
	45636,69	44613,18	127,94	895,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С111-1896 варіант 3	Шпаклівка Сатенгіс Кнауф	кг	3679,01	<u>4,57</u> 16813,08	<u>4,32</u> 15893,32	<u>0,16</u> 588,64	<u>0,09</u> 331,12	30 км.
21	С142-10-2	Вода	м3	2,642115	<u>17,3</u> 45,71	<u>17,30</u> 45,71	-	-	
22	+С1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,375	<u>68,67</u> 25,75	<u>67,09</u> 25,16	<u>0,23</u> 0,09	<u>1,35</u> 0,50	30 км.
23	+С1547-7 варіант 1	Світильник антивандальний Feron світлодіодний 100Вт	шт	75	<u>550,93</u> 41319,75	<u>540,00</u> 40500,00	<u>0,13</u> 9,75	<u>10,8</u> 810,00	30 км.
24	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3x1,5мм2 ВВП	1000м	0,15	<u>16648,48</u> 2497,27	<u>16639,38</u> 2495,91	<u>9,1</u> 1,36	-	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
25	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,5837	<u>1,5894</u> 32,72	<u>1,5894</u> 32,72			
		Разом	грн.		32,72	32,72			
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>145111,15</b>	<b>141395,67</b>	<b>921,07</b>	<b>2794,41</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	20,84					
		Мастильні матеріали	кг	0,017					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
